NAVECUNHA
LOGÍSTICA E TRANSPORTES

GRUPO VDA
GRUPO VALDIR DUARTE ALECRIM



RELATÓRIO MENSAL

Controle de Lubrificação

Frota de empurradores · Cap. José Alecrim

OUTUBRO DE 2026 (PARCIAL)

PERÍODO
01/10/2026 a 15/10/2026

ELABORADO POR
Admin
Supervisor de Manutenção da frota

EMISSÃO
15/10/2026 05:05

Referências: NP-055 – Plano de Gestão de Manutenção · FR 049_B (troca de óleo, filtros e fluidos) · FR 016_E

Resumo executivo

Visão geral do mês · Outubro de 2026 (parcial)

6
Trocas de óleo no mês

474 L
Óleo consumido

96%
Equipamentos em dia (92 de 96)

1
Trocas vencidas

3
A vencer em até 30 dias

12
Embarcações na frota

DESTAQUES DO MÊS

- Foram realizadas **6** trocas de óleo no mês, com consumo de **474 L**.
- **2 de 2** embarcações concentram cerca de 80% do óleo consumido; a maior é a **CJA I** (316 L).
- **1** equipamento(s) com troca vencida e **3** a vencer em até 30 dias. Os mais atrasados: CJA XVI (MCP BB).
- **96%** dos 96 equipamentos monitorados estão em dia.

SITUAÇÃO DA FROTA



HORAS ATÉ A PRÓXIMA TROCA · EMBARCAÇÕES MAIS CRÍTICAS

EMBARCAÇÃO	EQUIPAMENTO	FALTAM	PREVISÃO	SITUAÇÃO
CJA XVI	MCP BB	**−8 h**	atrasada	Vencido
CJA XIII	MCP BB	**7 h**	15/10/2026	≤ 30 dias
CJA XVII	MCP BB	**14 h**	16/10/2026	≤ 30 dias
CJA XX	MCP BB	**16 h**	16/10/2026	≤ 30 dias
CJA XIX	Motobomba	**47 h**	19/10/2026	≤ 30 dias
CJA XXI	MCP BB	**47 h**	19/10/2026	≤ 30 dias
CJA XXI	Motor de popa	**48 h**	19/10/2026	≤ 30 dias
CJA XV	Motobomba	**49 h**	19/10/2026	≤ 30 dias


Consumo de óleo

Litros lançados nos formulários FR 049_B e lançamentos rápidos · Outubro de 2026 (parcial)

474 L
Total da frota

474 L
SAE 15W-40


PARETO POR EMBARCAÇÃO

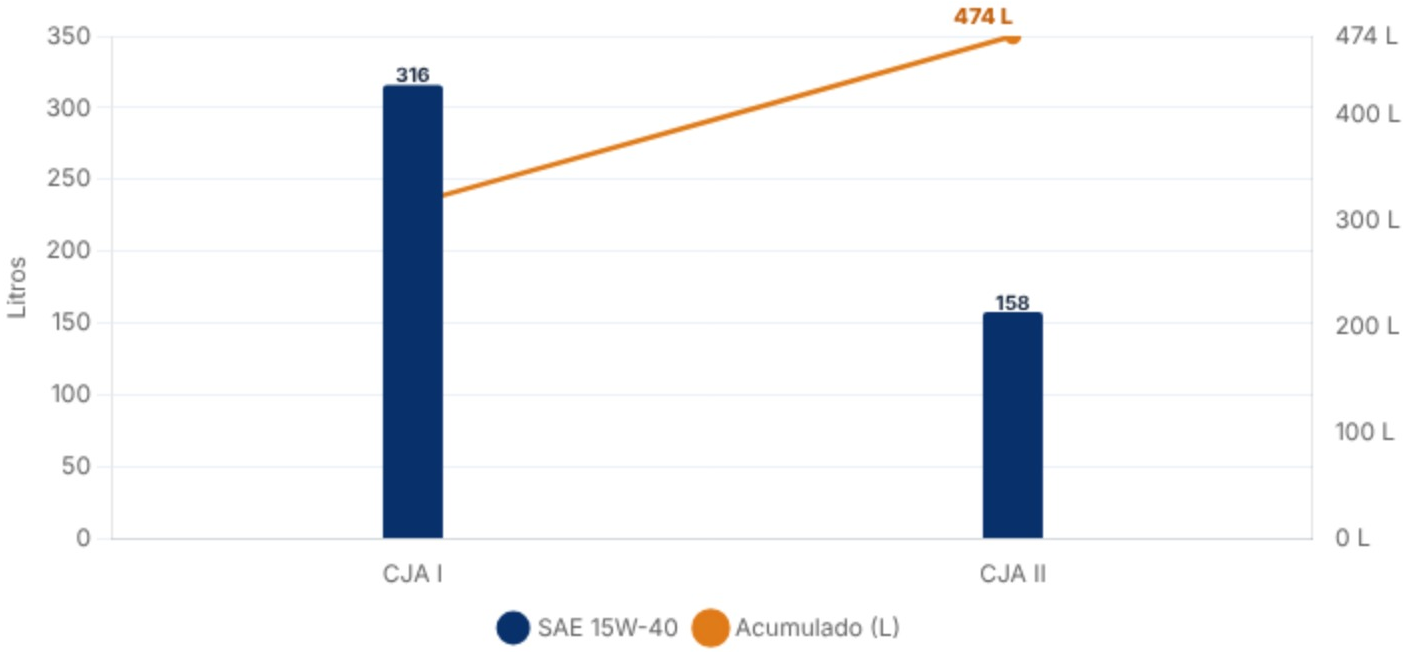

POR TIPO DE ÓLEO

ÓLEO	LITROS	%
SAE 15W-40	474	100%
Total	**474**	**100%**

EVOLUÇÃO · ÚLTIMOS 6 MESES

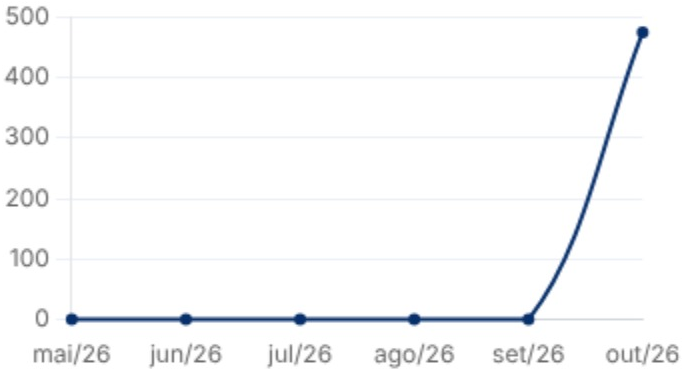

Trocas de óleo realizadas

6 lançamento(s) de troca no período · Outubro de 2026 (parcial)


DATA	EMBARCAÇÃO	EQUIPAMENTO	HORÍMETRO	ÓLEO	LITROS	O.M.	RESPONSÁVEL
02/10/2026	**CJA I**	MCP BB	9.002 h	SAE 15W-40	**120**	4001	Demo
02/10/2026	**CJA I**	MCA 1	5.000 h	SAE 15W-40	**38**	4001	Demo
03/10/2026	**CJA II**	MCP BB	9.003 h	SAE 15W-40	**120**	4002	Demo
03/10/2026	**CJA II**	MCA 1	5.000 h	SAE 15W-40	**38**	4002	Demo
05/10/2026	**CJA I**	MCP BB	9.005 h	SAE 15W-40	**120**	4003	Demo
05/10/2026	**CJA I**	MCA 1	5.000 h	SAE 15W-40	**38**	4003	Demo

Evidências fotográficas das trocas


3 troca(s) no mês · em ordem cronológica · fotos de antes e depois (do formulário FR 049_B)

1 **CJA I** · MCP BB 9.002 h · 120 L | MCA 1 5.000 h · 38 L — 02/10/2026 · O.M. 4001 · Demo

ANTES




Antes 1




Antes 2

DEPOIS



Depois 1



Depois 2

2 **CJA II** · MCP BB 9.003 h · 120 L | MCA 1 5.000 h · 38 L — 03/10/2026 · O.M. 4002 · Demo

ANTES



Antes 1

DEPOIS



Depois 1

3 **CJA I** · MCP BB 9.005 h · 120 L | MCA 1 5.000 h · 38 L — 05/10/2026 · O.M. 4003 · Demo

ANTES

sem foto

Antes · sem foto anexada

DEPOIS

sem foto

Depois · sem foto anexada

Situação e previsão de trocas

Equipamentos vencidos e que vencem nos próximos 60 dias · posição em 15/10/2026

TROCAS VENCIDAS (1)

EMBARCAÇÃO	EQUIPAMENTO	ATRASO	SITUAÇÃO
CJA XVI	MCP BB	**8 h**	Vencido

PRÓXIMAS TROCAS (94)

EMBARCAÇÃO	EQUIPAMENTO	FALTAM	PREVISÃO	PRAZO
CJA XIII	MCP BB	**7 h**	15/10/2026	≤ 30 dias
CJA XVII	MCP BB	**14 h**	16/10/2026	≤ 30 dias
CJA XX	MCP BB	**16 h**	16/10/2026	≤ 30 dias
CJA XIX	Motobomba	**47 h**	19/10/2026	≤ 30 dias
CJA XXI	MCP BB	**47 h**	19/10/2026	≤ 30 dias
CJA XXI	Motor de popa	**48 h**	19/10/2026	≤ 30 dias
CJA XV	Motobomba	**49 h**	19/10/2026	≤ 30 dias
CJA XVII	Motor de popa	**50 h**	19/10/2026	≤ 30 dias
CJA II	Motobomba	**51 h**	19/10/2026	≤ 30 dias
CJA XIX	Hidráulico (governo)	**51 h**	19/10/2026	≤ 30 dias
CJA XIII	Motor de popa	**52 h**	19/10/2026	≤ 30 dias
CJA XV	Hidráulico (governo)	**53 h**	19/10/2026	≤ 30 dias
CJA II	Hidráulico (governo)	**55 h**	19/10/2026	≤ 30 dias
CJA XIX	MCP BB	**73 h**	21/10/2026	≤ 30 dias
CJA XX	Motobomba	**74 h**	21/10/2026	≤ 30 dias
CJA XVI	Motobomba	**76 h**	21/10/2026	≤ 30 dias
CJA XVIII	Motor de popa	**77 h**	21/10/2026	≤ 30 dias
CJA X	Motobomba	**78 h**	21/10/2026	≤ 30 dias

Horímetro atual da frota

Última leitura registrada de cada equipamento · posição em 15/10/2026

EMBARCAÇÃO	MCP BB	MCP BE	REVERSOR BB	MCA 1	MCA 2	ÚLTIMA LEITURA
CJA I	9.005 h	12.151 h	12.150 h	5.000 h	12.151 h	05/10/2026
CJA II	9.003 h	12.153 h	12.152 h	5.000 h	12.153 h	03/10/2026
CJA X	12.154 h	—	12.154 h	12.154 h	12.154 h	—
CJA XIII	12.156 h	12.157 h	12.155 h	12.156 h	12.157 h	—
CJA XIV	12.158 h	—	12.157 h	12.158 h	12.158 h	—
CJA XV	12.160 h	—	12.158 h	12.160 h	12.160 h	—
CJA XVI	12.162 h	—	12.159 h	12.162 h	12.162 h	—
CJA XVII	12.164 h	—	12.160 h	12.164 h	12.164 h	—
CJA XVIII	12.166 h	—	12.161 h	12.166 h	12.166 h	—
CJA XIX	12.168 h	12.169 h	12.162 h	12.168 h	12.169 h	—
CJA XX	12.170 h	12.171 h	12.164 h	12.170 h	12.171 h	—
CJA XXI	12.172 h	12.173 h	12.166 h	12.172 h	12.173 h	—

"—" = equipamento sem leitura registrada.

Observações e encaminhamentos

Comentários do supervisor sobre o mês

Sem observações registradas.

PENDÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO

- Volumes de óleo dos reversores Hitachi MGN91BL e Masson MMW3700 e do hidráulico do leme ainda não informados pelos fabricantes (campos "___" na NP-055).
- Intervalos de troca divergentes entre a Matriz técnica e a NP-055 (MCP, Masson, Reintjes, Yanmar 4TNV98) aguardando definição.

Admin	Gerência
Supervisor de Manutenção da frota	Ciente

Navecunha · Grupo VDA

Controle de Lubrificação da frota de empurradores

Este relatório foi gerado automaticamente pelo painel CTLE_LUB com base nos lançamentos feitos nos formulários FR 049_B e nos lançamentos rápidos, até 15/10/2026 05:05.
